

Backlog — Semana 1

Sprint 01 · Preparação e Planejamento do Diagnóstico Organizacional

Duração	Equipe	Objetivo do Sprint
1 semana	12 pessoas	Estruturar o projeto, preparar os instrumentos de coleta e definir como, onde, com quem e o que será investigado.

Sprint Goal: Ao final da Semana 1, a equipe deve estar preparada para iniciar a coleta de dados na empresa, com escopo definido, responsabilidades distribuídas, instrumentos de coleta revisados, cronograma estabelecido e estratégia de investigação validada.

P0 — Bloqueadores

Essas tarefas precisam acontecer primeiro. Se não forem concluídas, o restante do projeto fica sem direção.

W1-01 — Definir escopo do diagnóstico

Responsável: Você | Apoio: Victor, Lucas, Ian

Tarefa:

- Definir exatamente o que será analisado
- Delimitar quais áreas/processos serão investigados
- Definir o que está fora do escopo
- Alinhar o objetivo do diagnóstico

Entrega: Documento curto contendo escopo + objetivo + limites da investigação.

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Objetivo definido
- ☐ Escopo definido
- ☐ Limites definidos
- ☐ Ian validou a viabilidade dentro da empresa
- ☐ Lucas revisou
- ☐ Equipe aprovou

W1-02 — Mapear áreas e pessoas da empresa

Responsável: Ian | Apoio: Ghabriel, Jairo

Tarefa:

- Setores relevantes
- Responsáveis de cada setor
- Pessoas que devem ser entrevistadas
- Processos importantes
- Sistemas utilizados em cada área

Entrega: Mapa inicial da empresa.

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Setores identificados
- ☐ Pessoas-chave identificadas
- ☐ Possíveis entrevistados definidos
- ☐ Processos críticos preliminarmente identificados

W1-03 — Definir cronograma das 4 semanas

Responsável: Você | Apoio: Lucas, Gabriel

Tarefa:

- Semana 1 → preparação
- Semana 2 → levantamento/mapeamento
- Semana 3 → diagnóstico
- Semana 4 → recomendações/entrega

Entrega: Cronograma oficial do projeto.

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Atividades das 4 semanas definidas
- ☐ Principais prazos definidos
- ☐ Reuniões definidas
- ☐ Responsáveis atribuídos

W1-04 — Definir sistema de organização do projeto

Responsável: Você | Apoio: Leandro, Luan

Tarefa:

- Documentos
- Súmulas
- Questionários
- Entrevistas
- Fluxogramas
- Diagnósticos
- Benchmarking
- Relatório
- Apresentação

```
PROJETO /  
  01_Organização  
  02_Levantamento  
  03_Mapeamento  
  04_Diagnóstico  
  05_Benchmarking  
  06_Recomendações  
  07_Relatório  
  08_Apresentação
```

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Estrutura criada
- ☐ Nomenclatura definida
- ☐ Equipe sabe onde salvar cada coisa

P1 — Instrumentos de Coleta

O roteiro prevê questionários e entrevistas como instrumentos de levantamento.

W1-05 — Revisar questionário

Responsável: Lucas | Apoio: Ghabriel, Ian

Tarefa:

- Perfil da empresa
- Infraestrutura
- Sistemas
- Processos
- Segurança
- Suporte
- Percepção dos usuários
- Alinhamento estratégico

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Perguntas revisadas
- ☐ Perguntas redundantes removidas
- ☐ Linguagem compreensível
- ☐ Perguntas relevantes para o diagnóstico
- ☐ Ian verificou se as perguntas fazem sentido para a realidade da empresa

W1-06 — Estruturar questionário digital

Responsável: Jairo | Apoio: Luan

Tarefa:

- Transformar o questionário em formulário

Entrega: Google Forms ou ferramenta definida pelo grupo.

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Todas as perguntas inseridas
- ☐ Seções organizadas
- ☐ Respostas configuradas
- ☐ Formulário testado

W1-07 — Criar roteiro de entrevistas

Responsável: Ghabriel | Apoio: Lucas, Ian

Tarefa:

- Rotina
- Dificuldades
- Sistemas
- Retrabalho
- Gargalos
- Comunicação
- Suporte
- Necessidades tecnológicas

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Roteiro criado
- ☐ Perguntas revisadas
- ☐ Perguntas adequadas aos diferentes setores
- ☐ Ian validou

W1-08 — Definir estratégia de entrevistas

Responsável: Ian | Apoio: Ghabriel, Jairo

Tarefa:

- Quem será entrevistado
- Qual setor
- Objetivo da entrevista
- Duração
- Ordem
- Responsável pela entrevista
- Responsável pelo registro

Setor	Entrevistado	Objetivo	Entrevistador	Data
X	Pessoa X	Processo Y	Ghabriel	XX/XX
Y	Pessoa Y	Sistema Z	Ian/Jairo	XX/XX

P1 — Preparação Técnica

Frente conduzida por Victor, Igor, Esabele e Kauã. O roteiro prevê levantamento de sistemas, hardware, infraestrutura e processos.

W1-09 — Definir checklist de infraestrutura

Responsável: Victor | Apoio: Igor

Tarefa:

- Computadores
- Periféricos
- Servidores
- Rede
- Internet
- Sistemas
- Armazenamento
- Segurança
- Ferramentas utilizadas

Entrega: Checklist de infraestrutura/TI.

W1-10 — Definir checklist de sistemas

Responsável: Igor | Apoio: Victor

Nome:
Finalidade:
Setor:
Usuários:
Problemas:
Integrações:
Frequência de uso:
Dependências:

Definição de Pronto (DoD):

- ☐ Modelo pronto
- ☐ Validado por Victor
- ☐ Pronto para aplicação na Semana 2

W1-11 — Definir processos críticos a mapear

Responsável: Esabele e Kauã | Apoio: Ian

Tarefa:

- Processos mais importantes
- Processos com maior volume
- Processos com retrabalho
- Processos dependentes de TI
- Processos que podem apresentar gargalos

Entrega: Lista priorizada de processos para fluxograma.

P2 — Pesquisa e Contexto

Prepara o terreno para benchmarking e análise, sem antecipar soluções antes de conhecer o problema.

W1-12 — Levantar contexto do setor

Responsável: Gabriel | Apoio: Leandro

Tarefa:

- Características do setor
- Tecnologias normalmente utilizadas
- Tendências relevantes
- Problemas comuns do segmento
- Exemplos de modernização

Entrega: Documento de contexto do setor.

Importante: isso é contexto, não recomendação final.

W1-13 — Criar matriz de evidências

Responsável: Leandro | Apoio: Jairo, Lucas

Problema observado	Fonte	Evidência	Área	Validado?
—	—	—	—	—

Essa matriz será muito útil nas semanas 2 e 3.

P2 — Governança do Projeto

W1-14 — Criar modelo oficial de súmula

Responsável: Você

SÚMULA — REUNIÃO #__

Data:

Horário:

Local:

Participantes:

PAUTA

1.

2.

3.

DISCUSSÕES

-

DECISÕES

-

TAREFAS

Responsável:

Tarefa:

Prazo:

Status:

PENDÊNCIAS

-

PRÓXIMA REUNIÃO

Data:

Objetivo:


Definição de Pronto (DoD):

☐ Modelo aprovado

☐ Todas as reuniões usarão o mesmo padrão

W1-15 — Criar quadro de acompanhamento

Responsável: Você | Apoio: Leandro

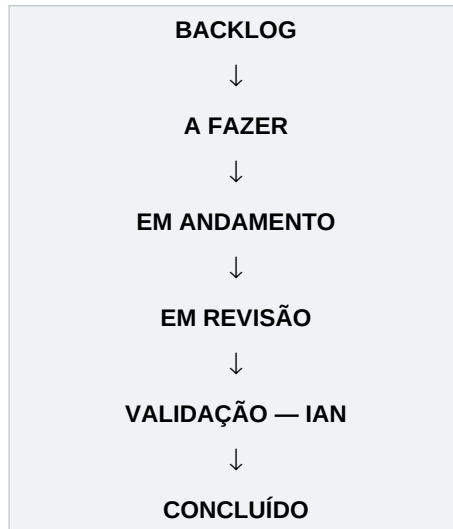

Importante para não descobrir na sexta-feira que uma tarefa estava "quase pronta" desde terça.

W1-16 — Reunião de alinhamento geral

Responsável: Você

Pauta:

- 1 Apresentar objetivo
- 2 Explicar o roteiro
- 3 Apresentar divisão
- 4 Explicar responsabilidades
- 5 Apresentar cronograma
- 6 Explicar sistema de arquivos
- 7 Explicar súmulas
- 8 Explicar critérios de entrega
- 9 Definir próximos passos

Resultado esperado: cada pessoa deve sair sabendo "Qual é minha responsabilidade nesta semana?", e não apenas "Eu estou no grupo."

Entregáveis da Semana 1

No final da sexta-feira, a equipe precisa ter estes artefatos prontos:

Organização

- ☐ Escopo do projeto
- ☐ Objetivo
- ☐ Cronograma de 4 semanas
- ☐ Divisão de responsabilidades
- ☐ Estrutura de arquivos
- ☐ Modelo de súmula
- ☐ Quadro de acompanhamento

Empresa

- ☐ Mapa dos setores
- ☐ Pessoas-chave
- ☐ Entrevistados
- ☐ Processos preliminares

Levantamento

- ☐ Questionário revisado
- ☐ Formulário pronto
- ☐ Roteiro de entrevistas
- ☐ Calendário de entrevistas

TI

- ☐ Checklist de infraestrutura
- ☐ Checklist de sistemas
- ☐ Lista de processos a mapear

Análise

- ☐ Matriz de evidências
- ☐ Contexto inicial do setor

Definition of Done — Semana 1

A Semana 1 só está concluída quando a equipe consegue começar a coleta sem precisar parar para decidir quem pergunta, o que pergunta, para quem pergunta ou onde registra a informação.

Pessoa	Principal entrega da Semana 1
Você	Escopo + cronograma + governança
Ian	Mapa da empresa + entrevistados
Ghabriel	Roteiro de entrevistas
Jairo	Formulário

Luan	Documentação
Victor	Checklist de infraestrutura
Igor	Checklist de sistemas
Esabele	Processos críticos
Kauã	Processos críticos / estrutura dos fluxos
Lucas	Revisão do questionário
Leandro	Matriz de evidências
Gabriel	Contexto / benchmarking inicial

As tarefas possuem dependências entre si: Lucas revisa o questionário **antes** de Jairo fechar o formulário; Ian identifica entrevistados **antes** de Ghabriel fechar a agenda; Victor e Igor definem os checklists **antes** da coleta técnica. Essa sequência transforma o grupo de 12 pessoas em um projeto coordenado.
